BA1 GU Rheinfelden
Zeitplan
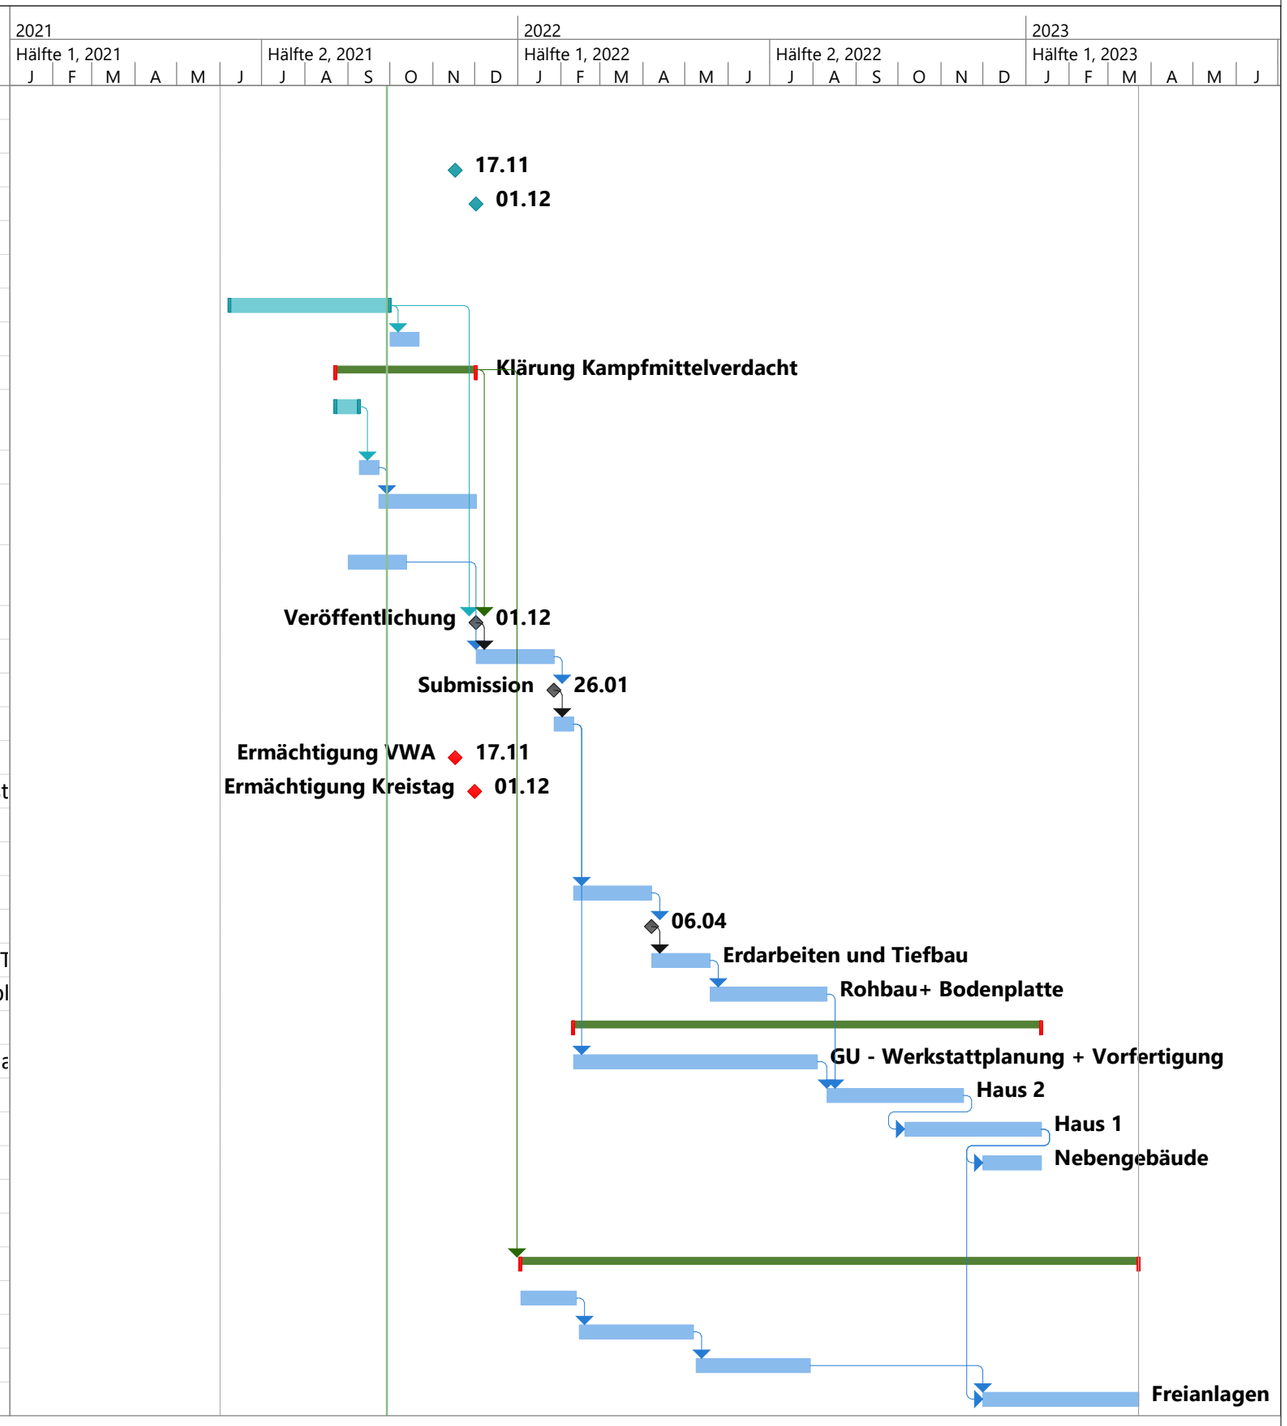
Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen
1						
2						
3		VWA	0 Tage	Mit 17.11.21	Mit 17.11.21	
4		Kreistag	0 Tage	Mit 01.12.21	Mit 01.12.21	
5						
6		**AUSSCHREIBUNG**				
7		Anpassung LVs	83 Tage	Die 08.06.21	Don 30.09.21	
8		Prüfung der LVs	15 Tage	Fre 01.10.21	Don 21.10.21	
9		**Klärung Kampfmittelverdacht**	**73 Tage**	**Mon 23.08.2**	**Mit 01.12.21**	
10		Kostenschätzung Kampfmittelräumung	13 Tage	Mon 23.08.21	Mit 08.09.21	
11		Einigung ED	10 Tage	Don 09.09.21	Mit 22.09.21	
12		Nachweis Kampfmittelfreiheit	50 Tage	Don 23.09.21	Mit 01.12.21	
13		Rechtberatung und Erstellung des GU Vertrages	30 Tage	Mit 01.09.21	Die 12.10.21	
14		Veröffentlichung	0 Tage	Mit 01.12.21	Mit 01.12.21	
15		Submission	40 Tage	Don 02.12.21	Mit 26.01.22	
16			0 Tage	Mit 26.01.22	Mit 26.01.22	Submission
17		Prüfung der Angebote	10 Tage	Don 27.01.22	Mit 09.02.22	
18		Ermächtigung VWA	0 Tage	Mit 17.11.21	Mit 17.11.21	
19		Ermächtigung Kreistag	0 Tage	Mit 01.12.21	Mit 01.12.21	Vergabe im Kreist
20						
21		**BAUPHASE**				
22		Vorbereitung Unternehmer	40 Tage	Don 10.02.22	Mit 06.04.22	
23		Baubeginn	0 Tage	Mit 06.04.22	Mit 06.04.22	
24		Erdarbeiten+Tiefbau	30 Tage	Don 07.04.22	Mit 18.05.22	Erdarbeiten und T
25		Rohbau + Bodenplatte	60 Tage	Don 19.05.22	Mit 10.08.22	Rohbau+ Bodenpl
26		Generalunternehmer	**240 Tage**	**Don 10.02.22**	**Mit 11.01.23**	
27		Plaung + Vorbereitung	125 Tage	Don 10.02.22	Mit 03.08.22	GU - Werkstattpla
28		Bau Haus 2	70 Tage	Don 11.08.22	Mit 16.11.22	Haus 2
29		Bau Haus 1	70 Tage	Don 06.10.22	Mit 11.01.23	Haus 1
30		Nebengebäude	30 Tage	Don 01.12.22	Mit 11.01.23	Nebengebäude
31						
32						
33		**FREIANLAGEN**	**318 Tage**	**Mon 03.01.2**	**Mit 22.03.23**	
34		Erstellung LVs	30 Tage	Mon 03.01.2	Fre 11.02.22	
35		Ausschreibung + Vergabe	60 Tage	Mon 14.02.2	Fre 06.05.22	
36		Vorlaufzeit	60 Tage	Mon 09.05.2	Fre 29.07.22	
37		Freianlagen	80 Tage	Don 01.12.22	Mit 22.03.23	Freianlagen
