Generalplan **Neubau Pflegezentrum Schliengen**
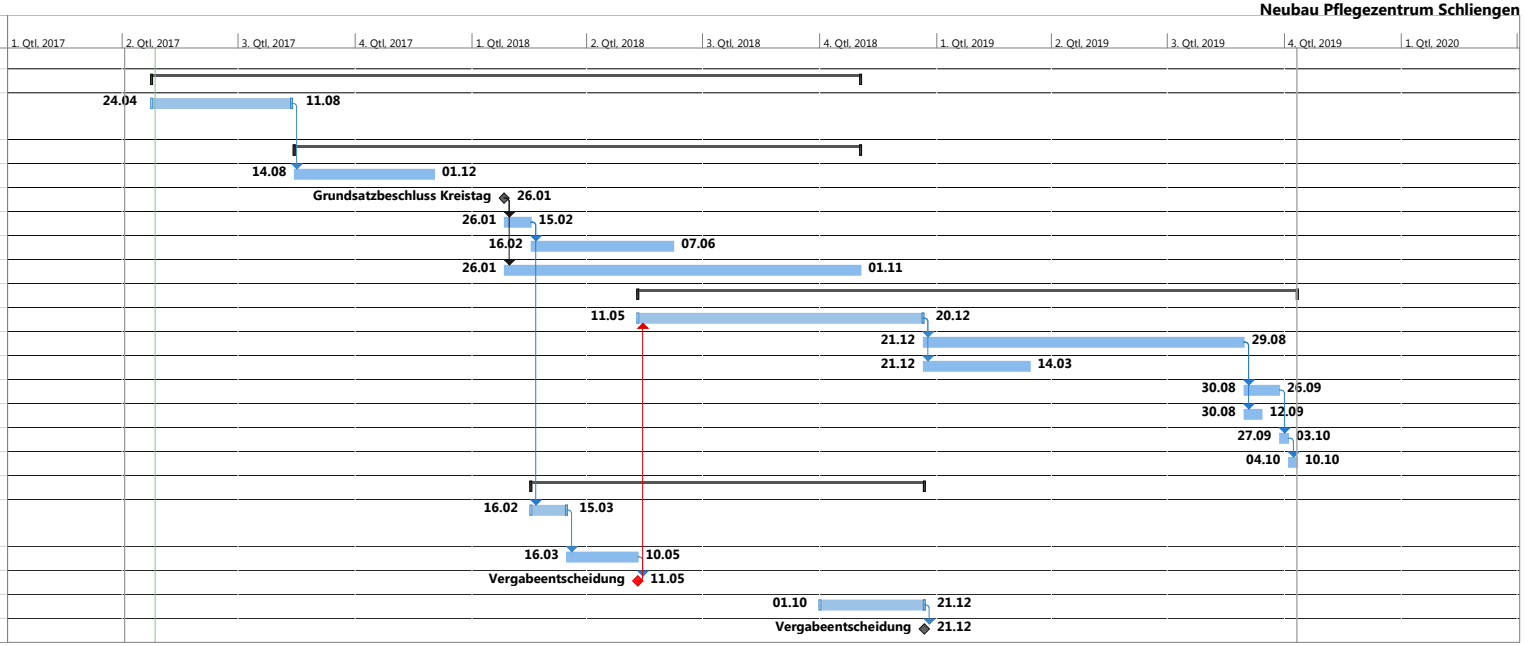
Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer
1			
2		**Vorbereitung**	**399 Tage**
3		VgV Verfahren	4 Monate
4		**Planung**	**319 Tage**
5		Vorentwurf, Entwurfsplanung	4 Monate
6		Grundsatzbeschluss Kreistag	0 Tage
7		Erstellen Bauantrag	15 Tage
8		Baugenehmigung	80 Tage
9		Werkplanung	10 Monate
10		**Bauarbeiten**	**370 Tage**
11		Rohbauarbeiten	8 Monate
12		Ausbauarbeiten	9 Monate
13		Freianlagen	12 Wochen
14		Ausstattung	4 Wochen
15		Abnahmen	2 Wochen
16		Probebetrieb	1 Woche
17		Einzug	1 Woche
18		**Ausschreibungen**	**221 Tage**
19		Ausschreibungsvorbereitung Paket 1	1 Monat
20		Ausschreibung	8 Wochen
21		Vergabeentscheidung	0 Tage
22		Ausschreibungen Ausbau	12 Wochen
23		Vergabeentscheidung	0 Tage
