Deponie Scheinberg - Projektablaufplan
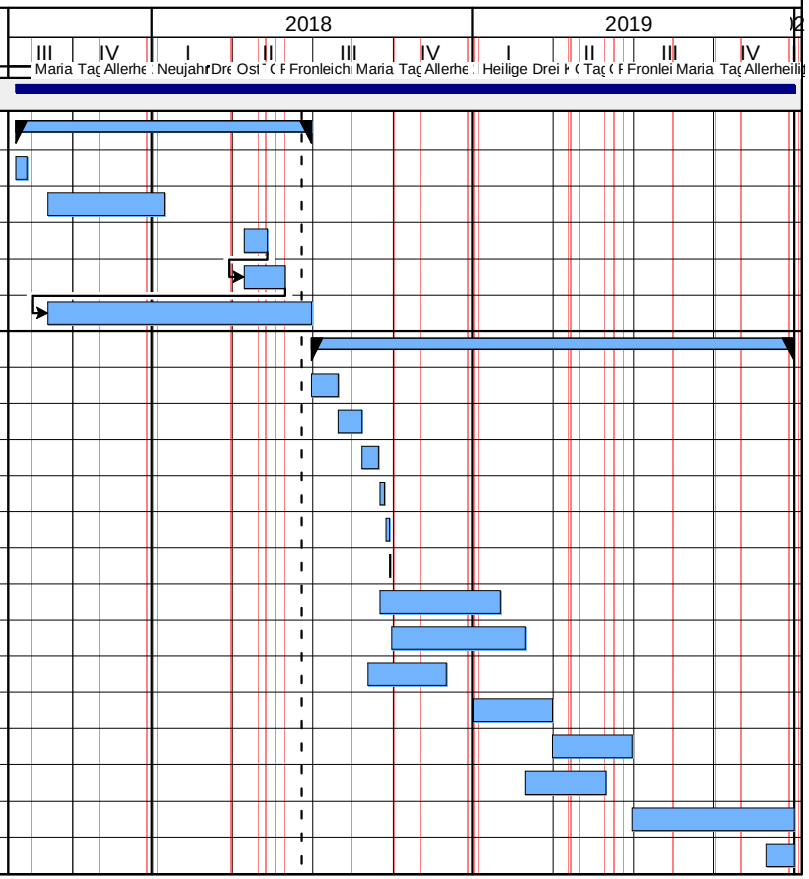
Nr.	Vorgang	Beginn gepl	Ende gepl	Dauer
01	**Deponie Scheinberg - Deponiebelüftung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative**	**30.07.17**	**31.12.19**	**601,00 T**
02	**Potenzialanalyse**	**30.07.17**	**30.06.18**	**228,00 T**
03	Absaugversuche	30.07.17	11.08.17	10,00 T
04	Auswertung	04.09.17	14.01.18	90,00 T
05	Absaugversuche	16.04.18	11.05.18	18,00 T
06	Auswertung	16.04.18	31.05.18	30,00 T
07	Erstellung Potenzialstudie	04.09.17	30.06.18	204,00 T
08	**Deponiestabilisierung**	**01.07.18**	**31.12.19**	**373,00 T**
09	Vorplang LP 2	01.07.18	31.07.18	22,00 T
10	Entwurfsplanung LP 3	01.08.18	26.08.18	17,00 T
11	Genehmigungsplanung LP 4	27.08.18	14.09.18	15,00 T
12	Erstellung Antragsunterlagen für PTJ	17.09.18	21.09.18	5,00 T
13	Abstimmung mit AG	24.09.18	27.09.18	4,00 T
14	Einreichung Antrag für Investive Maßnahmen	28.09.18	28.09.18	1,00 T
15	Bearbeitungszeit Genehmigungsbehörde (Annahme)	17.09.18	31.01.19	93,00 T
16	Bearbeitungszeit PTJ (Annahme)	01.10.18	28.02.19	103,00 T
17	Beauftragung Ing.-Leistung LP 5-7	03.09.18	30.11.18	63,00 T
18	Ausführungsplanung, LV-Erstellung, LP 5-6	01.01.19	31.03.19	63,00 T
19	Ausschreibung und Vergabe, LP 7	01.04.19	30.06.19	59,00 T
20	Beauftragung Ing.-Leistung LP 8	01.03.19	31.05.19	62,00 T
21	Beginn Ausführung / Bau LP 8	01.07.19	31.12.19	126,00 T
22	Inbetriebnahme Stabilisierungsanlage	01.12.19	31.12.19	19,00 T
